



รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการ
“**เฝ้าช่วย เฝ้าบ้าน ต้อนฮับสงกรานต์ปีใหม่เมือง**”

ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562

จัดทำโดย เครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติเมืองแม่สอด และผู้นำชุมชน
สนับสนุนโดย อำเภอแม่สอด, เทศบาลนครแม่สอด, สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา,
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)



PDF file





ความเป็นมาและเป้าหมาย

สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดำเนินงานโครงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ ระยะเวลาดำเนินการ 22 เดือน (1 กันยายน 2560 - มิถุนายน 2562) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีแนวทางการดำเนินงาน 2 ด้าน คือ 1) การพัฒนากลไกเชิงบูรณาการและความรู้เพื่อลดทอนความเสี่ยงภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัย และ 2) การสร้างเครือข่ายการลดทอนความเสี่ยงในระดับพื้นที่ในเวสต์ลุ่มน้ำ ซึ่งชุมชนแม่สอด เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ปฏิบัติสำคัญภายใต้โครงการฯ

การปรับปรุงสภาพพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและลดความเสี่ยงภัยพิบัติ อำเภอแม่สอด เป็นกิจกรรมในแผนงานการสนับสนุนการดำเนินงานเตรียมความพร้อม และพัฒนากลไกที่มีศักยภาพในการดำเนินงานลดความเสี่ยงในพื้นที่ ของโครงการฯ และสืบเนื่องจากการประชุมปฏิบัติการเชื่อมร้อยการดำเนินงานลดความเสี่ยงเมืองแม่สอด 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ต่างเห็นพ้องต่อทิศทางการทำงาน และหน่วยงานที่เข้าร่วมต่างแสดงความยินดีขับเคลื่อนร่วมกันแบบเครือข่าย เวทีดังกล่าวยังเป็นโอกาสในการระดมข้อมูล พร้อมทั้งประเมินความเสี่ยง และข้อเสนอการจัดการตามสถานการณ์ภัย

“เผ่าห้วย เผ่าบ้าน คือนั้บสงกรานดปีใหม่เมือง” เป็นโครงการย่อยที่เกิดจากการขับเคลื่อนร่วมกัน มีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างภูมิทัศน์ลำห้วยที่สะอาดสวยงาม ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 จัดทำโดย เครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติเมืองแม่สอด และผู้นำชุมชน ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ จากทั้งอำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด หน่วยทหาร และภาคเอกชน



การดำเนินงาน

การดำเนินโครงการพัฒนาลำห้วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ท้องถิ่นให้สามารถเข้าใจความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่มีความเฉพาะเจาะจงพื้นที่ สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้ มีระบบข้อมูลต่อการรับมือ บรรเทาผลกระทบ รวมถึงการฟื้นฟูที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานจึงมีขั้นตอนดังนี้ 1) การประชุมวางแผน 2) การปฏิบัติการ และ 3) การสรุปบทเรียนรู้

1) การประชุมวางแผน

วงคุยขนาดเล็กประกอบด้วยผู้นำชุมชน แกนนำ กว่า 10 คน จากหลายชุมชน ได้ร่วมกันออกแบบกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดลำห้วย และเลือกเส้นทางห้วยแม่สอดเป็นพื้นที่ดำเนินการ ทั้งนี้พิจารณาจากข้อมูลที่ได้ดำเนินการสำรวจ พบว่าแม่สอดเป็นสายน้ำหลักที่มีความสำคัญในช่วงน้ำท่วม การจัดการทำความสะอาดจะช่วยลดทอนภัยได้ อีกทั้งยังเป็นสายน้ำที่เชื่อมต่อพื้นที่ถึง 9 ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมให้แก่ชุมชน โดยระยะทางรวม 8.5 กิโลเมตร กำหนดระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 เริ่มต้นพื้นที่ชุมชนร่วมแรง จนถึงชุมชนสองแคว2 ส่วนหนึ่งของการเตรียมการมีการลงพื้นที่สำรวจลำห้วยแม่สอดเพื่อประเมินการทำงานพบว่า พื้นที่บางจุดจำเป็นต้องใช้แรงงาน จึงมีการจัดจ้างแรงงานพม่าส่วนหนึ่ง

สำหรับการตั้งชื่อโครงการฯ อิงกับงานเทศกาลสงกรานต์ ปีใหม่ไทย กับการเริ่มต้นสิ่งดีให้แก่บ้านเมืองเพื่อความสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่ และยังเป็นสิริมงคลอีกด้วย ที่ประชุมได้แบ่งงานการจัดการเรื่องอาหาร การจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ และกำลังแรงงาน ด้านหนึ่งทางอำเภอจัดทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังเทศบาลนครแม่สอด และหน่วยทหาร เพื่อขอการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ รถยนต์ และกำลังพล ขณะที่แต่ละชุมชนประชาสัมพันธ์ถึงสมาชิกชุมชนผ่านสปอศวิทยุ และการเชิญชวนของผู้นำผ่านเสียงตามสายของชุมชน

แผนภาพที่ 1 แสดงการประชุมเตรียมความพร้อม



2) ปฏิบัติการ และผลการดำเนินการ

การดำเนินการทำความสะอาดลำห้วยแม่สออด ทั้งการจัดเก็บกิ่งไม้บริเวณสะพาน การจัดเก็บขยะ ผักตบชวา การตัดต้นไม้ และวัชพืช ในแต่ละวันเริ่มต้นที่เวลา 08.30-17.00 น. รวมระยะทางทำความสะอาดตลอดลำห้วยแม่สออด 8.5 กิโลเมตร สามารถจัดเก็บขยะ วัชพืชได้ราว 40.5 ตัน ส่วนใหญ่เป็นกิ่งไม้ วัชพืช และขยะ


ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละวันเฉลี่ย 50-70 คน ประกอบด้วย ชุมชน, แรงงานพม่า, อำเภอแม่สออด, เทศบาลนครแม่สออด (กองช่างสุขาภิบาล, ปก.), หน่วยทหาร จาก 4 ส่วน คือ กองอาสารักษาดินแดง, หน่วยเฉพาะกิจกองทหารราบที่ 14, ร้อย 431 กองทหารราบที่ 4, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 33 สำนักงานพัฒนาภาคที่ 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา) และภาคเอกชน (บริษัทคลื่น ไซเคิล จำกัด)

กิจกรรมนี้ยังมีงบประมาณและสิ่งของบริจาคจากชุมชนและหน่วยงานสมทบร่วม

ตารางที่ 1 แสดงวันและพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดลำห้วยแม่สออด

วันที่	ชุมชน	พื้นที่เป้าหมาย (8.5 กิโลเมตร)	พื้นที่ดำเนินการจริง	ระยะทาง (กิโลเมตร)
11 มีนาคม 2562	ร่วมแรง-สันตันปิน	สะพานที่การชุมชนร่วมแรง-สะพานบ้านป่าเกิด	สะพานที่การชุมชนร่วมแรง-สะพานบ้านป่าเกิด	1.47
12 มีนาคม 2562	ดอนไชย-มณีไพรสนธ์	สะพานบ้านป่าเกิด-วัดมณีไพรสนธ์	สะพานบ้านป่าเกิด-สะพานบริเวณที่ทำการชุมชนจ็อกจ่อ	1.55
13 มีนาคม 2562	จ็อกจ่อ-ชุมพลพัฒนา	วัดมณีไพรสนธ์-บ้านท่อ	สะพานบริเวณที่ทำการชุมชนจ็อกจ่อ – สะพานพื้นที่รอยต่อบ้านท่อ	1.29
14 มีนาคม 2562	ร่วมใจ-สองแคว1	บ้านท่อ-สะพานสองแควสอง	สะพานพื้นที่รอยต่อบ้านท่อ-สะพานหลังวัดดอนไชย	1.70
15 มีนาคม 2562	สองแคว1-สองแคว2	สะพานสองแควสอง-สายตัดใหม่	สะพานหลังวัดดอนไชย -ประตูละบายน้ำสองแควสอง	1.69
				7.70

แผนภาพที่ 1 แสดงแผนเส้นทางการทำความสะอาดลำห้วยแม่สอ 5 วันดำเนินการ

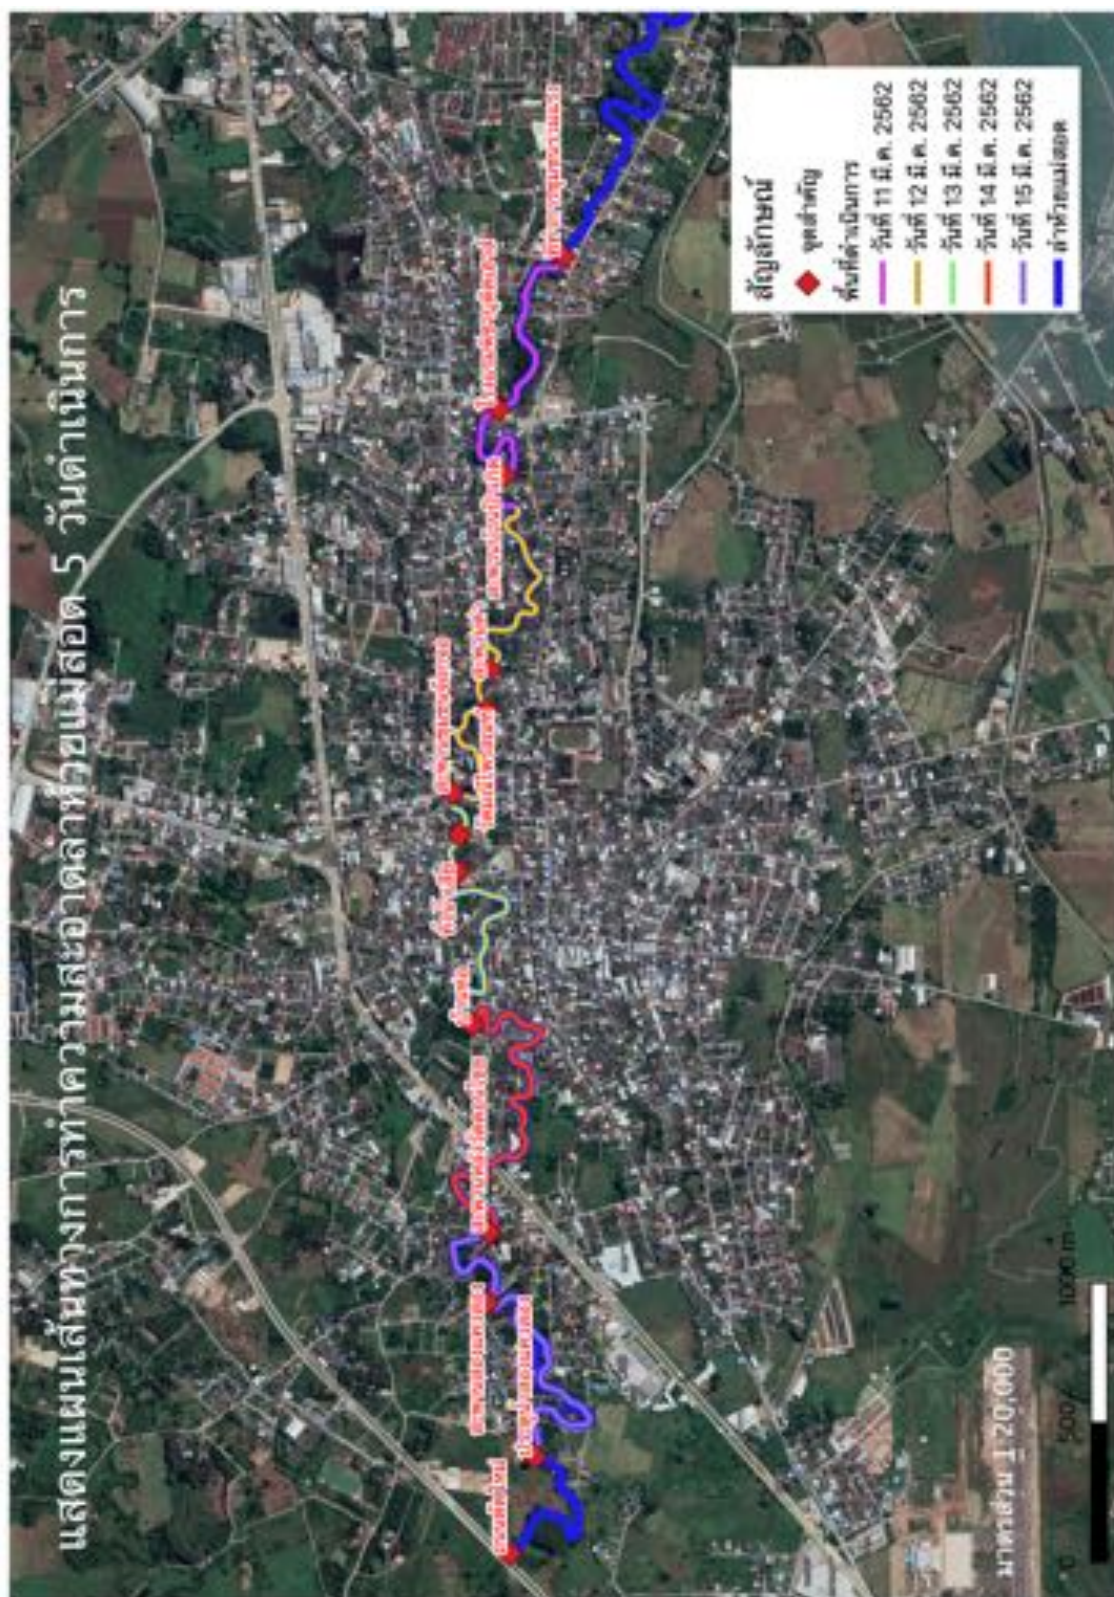


ตารางที่ 2 จำนวนรอบการจัดเก็บขยะ-วัชพืช และปริมาณที่จัดเก็บ

เส้นทาง	รอบการขน			จำนวน น้ำหนักที่ขน รวม
	รถขยะเล็ก	รถขยะใหญ่ 1	รถขยะขยะใหญ่ 2	
ร่วมแรง-สันตติปิน	-	2 (ต้นไม้+ขยะ) (4 คัน)	2 (ต้นไม้ + ขยะ) (4 คัน)	8 คัน
ดอนไชย-มณีไพรสณฑ์	2 (เศษไม้) (1 คัน)	1 (เศษไม้+วัชพืช) (2 คัน)	1 (เศษไม้+วัชพืช) (2 คัน)	5 คัน
จ็อกจอ-ชุมพล	2 (เศษไม้) (1 คัน)	3 (เศษไม้+ผักตบ) (6 คัน)	3 (เศษไม้ + ผักตบ) (6 คัน)	13 คัน
ร่วมใจ-สองแคว1	1 (ดินหญ้า) (0.5 คัน)	4 (เศษไม้+ผักตบ) (8 คัน)	1 (เศษไม้+ผักตบ) (2 คัน)	10.5 คัน
สองแคว1-สองแคว2	-	1 (เศษไม้+วัชพืช) (2 คัน)	1 (เศษไม้+วัชพืช) (2 คัน)	4 คัน
				40.5 คัน

หมายเหตุ : กระบะเล็กรอบละ 1/2 คัน/คัน/รอบ และ กระบะใหญ่ 2 คัน/คัน/รอบ

แผนภาพที่ 2 แสดงการดำเนินการก่อน-ระหว่าง-หลังทำความสะอาด

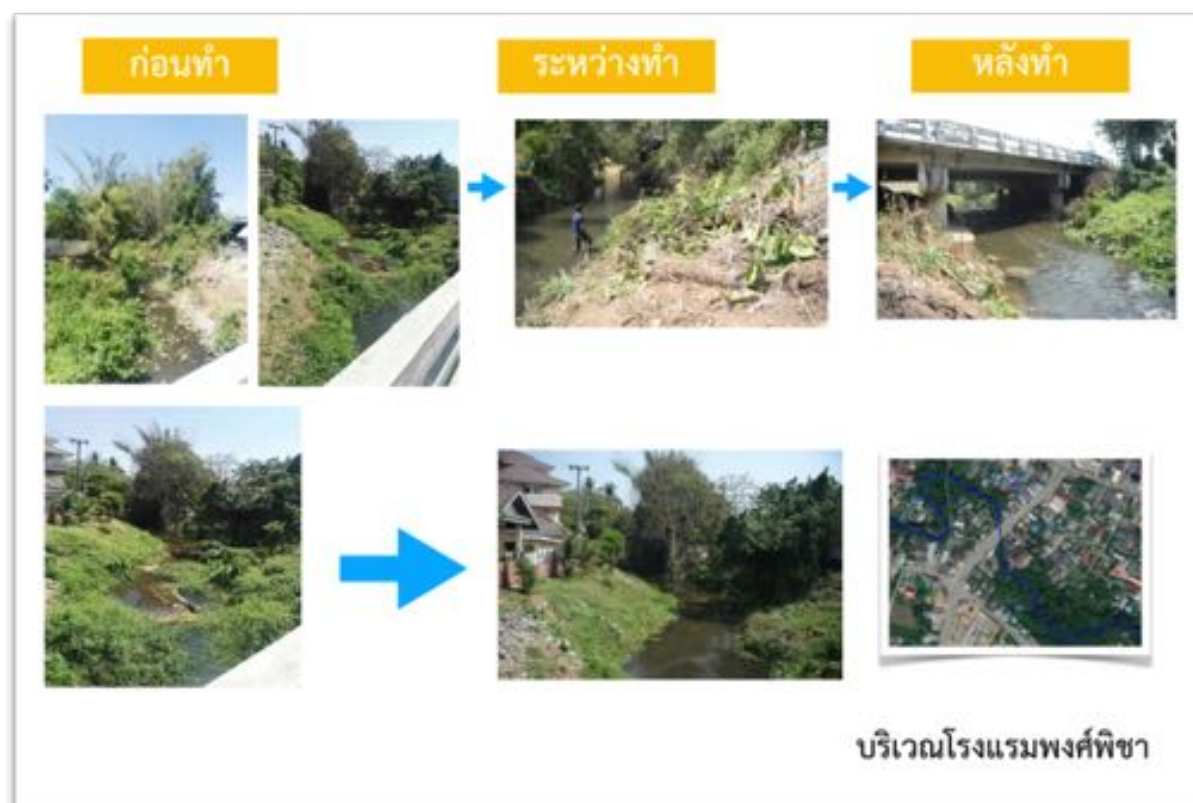








แผนภาพที่ 3 แสดงจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน

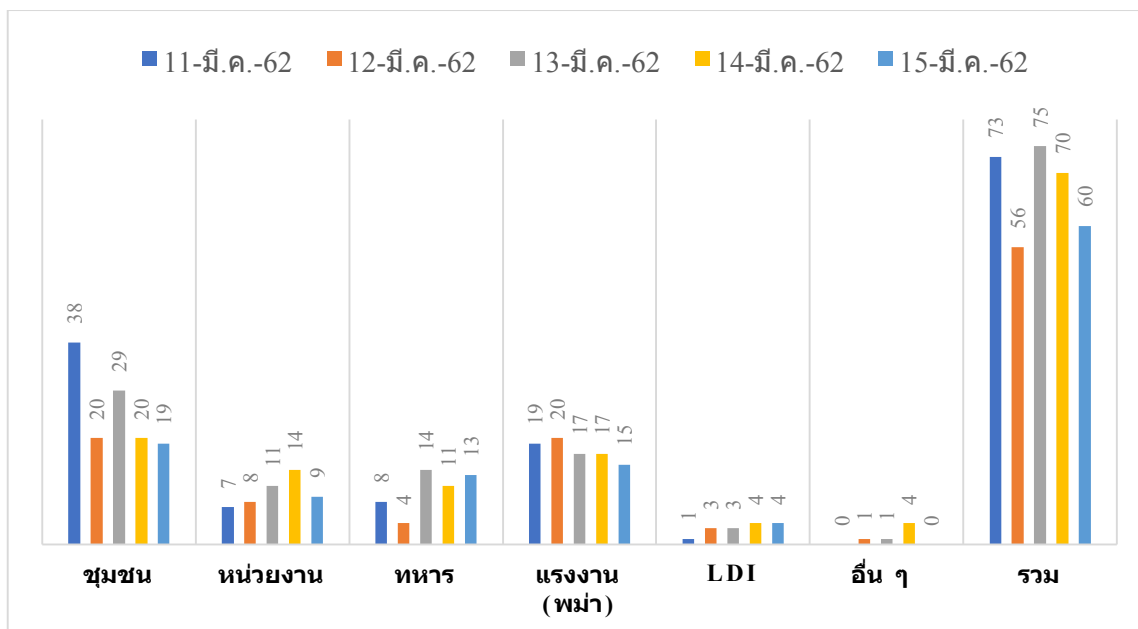

ตารางที่ 3 แสดงแสดงข้อมูลผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายวัน (คน)

	ชุมชน	หน่วยงาน	ทหาร	แรงงาน (พม่า)	LDI	อื่น ๆ	รวม
11-มี.ค.-62	38	7	8	19	1	0	73
12-มี.ค.-62	20	8	4	20	3	1	56
13-มี.ค.-62	29	11	14	17	3	1	75
14-มี.ค.-62	20	14	11	17	4	4	70
15-มี.ค.-62	19	9	13	15	4	0	60
						รวม	334 คน



ตารางที่ 3 แสดงรายการการสมทบ

วันที่	เส้นทางระหว่างชุมชน	จำนวนเงิน	อุปกรณ์/พาหนะ	อาหารและเครื่องดื่ม	แรงงาน
11-มี.ค.-62	ร่วมแรง-สันตปิ่น	20,000 บาท สนับสนุน จากเทศบาล นครแม่สอด	1.ไว้นิลป้ายโครงการ (LDI) 2.รองเท้าบู๊ท 1 โหล (LDI) 3.ถุงมือสีส้ม 1 โหล (LDI) 4.คราด 2 เล่ม (LDI) 5.มีด 10 เล่ม (LDI) 6.เชือก 1 มัด (LDI) 7.เรือเหล็กใหญ่ 2 ลำ (ปก.)	1.เครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน 20 ขวด (เอมรีย 20 ขวด :ชุมชน) 2.ขนมปัง จำนวน 50 ห่อ (ชุมชน) 3.น้ำเปล่าเป็นแก้ว จำนวน 1 ลิ้ง (ชุมชน) 4.ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน 5,000 บาท (LDI)	1.ค่าแรงงาน (พม่า) 19 คน x 300 บาท (5,700 บาท) (LDI)
12-มี.ค.-62	ดอนไชย-มณีไพรส์		1.เครื่องตัดหญ้า 4 เครื่อง (กองอาสารักษาดินแดง) 2.เรือพลาสติกเล็ก 3 ลำ (หน่วยดับเพลิง 1 ลำ, กอง อาสารักษาดินแดง 2 ลำ)	1.ข้าวกล่อง จำนวน 20 กล่อง (ชุมชน) 2.ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน 5,000 บาท (LDI)	1.ค่าแรงงาน (พม่า) 20 คน x 300 บาท (6,000 บาท) (LDI)
13-มี.ค.-62	จ็อกจอ-ชุมพล	4,700	1.เรือพลาสติกเล็ก 3 ลำ (หน่วยดับเพลิง 1 ลำ, กอง อาสารักษาดินแดง 2 ลำ) 2.เลื่อยยนต์ 2 ตัว (หน่วยดับเพลิง 1 ตัวใหญ่ ,..... 1 ตัวเล็ก) 3.เครื่องตัดหญ้า 4 เครื่อง (กองอาสารักษาดินแดง) 4.รถยนต์ขนขยะ 3 คัน (เทศบาลแม่สอด กระบะเล็ก 1 คัน, กระบะใหญ่ 2 คัน) 5. มีด 2 ค้าง (LDI) 6. คราด 2 ค้าง (LDI) 7. ถุงมือ 2 โหล	1.เครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน 6 ลิ้ง และ 4 แพค (สไปนเซอร์ 4 ลิ้ง เอ็มรีย 2 ลิ้ง+4 แพ็ค : ชุมชน + LDI) 2. ราคิน้ำ จำนวน 1 ถุงใหญ่ (ชุมชน) 3.ค่าอาหารกลางวันและน้ำดื่ม จำนวน 5,000 บาท (LDI)	1.ค่าแรงงาน (พม่า) 17 คน x 300 บาท (5,100 บาท) (LDI)



วันที่	เส้นทางระหว่างชุมชน	จำนวนเงิน	อุปกรณ์/พาหนะ	อาหารและเครื่องดื่ม	แรงงาน
14-มี.ค.-62	ร่วมใจ-สองแคว1	10,300	1.มิดหวด 2 ค้ำ มิดเล็ก 2 ค้ำ (กองทหาร 413) 2.เลื่อยยนต์ 1 ตัว (หน่วยดับเพลิง) 3.เครื่องตัดหญ้า 4 เครื่อง (กองอาสารักษาดินแดง) 4.ตระกร้าพลาสติก 1 ใบ 5.ซูชิฟ 12 ตัว 6.รถยนต์ขนขยะ 4 คัน (เทศบาลแม่สออด รดกะบะใหญ่ 2 คัน และรดกะบะเล็ก 1 คัน, บริษัทกลีนไชเคิล : รดกะบะ 1 คัน) 7.เรือพลาสติก 3 ลำ (หน่วยดับเพลิง 1 ลำ, กองอาสา ดินแดง 2 ลำ) 8.มิด ค้ำ 9.คราด ค้ำ	1.เครื่องดื่มชูกำลัง จำนวน 70 ขวด และ 1 แพค (เอ็ม ร้อย 60 ขวด, คาราบาว 10 ขวด + 1 แพ็ค : ชุมชน) 2. น้ำดื่ม จำนวน 7 ขวด และ 25 แพค (ชุมชน) 3. น้ำอัดลม จำนวน 3 ขวด และ 1 แพค (ชุมชน) 4. น้ำผลไม้ จำนวน 2 ขวด (น้ำส้ม 2 ขวด : ชุมชน) 5. น้ำหวาน จำนวน 2 หม้อ+10 ขวด+15 ถู (ชุมชน) 6. ซาลาเปา จำนวน 50 ลูก (ชุมชน) 7. มาม่า จำนวน 1 กล่อง (ชุมชน) 8. ผลไม้ จำนวน 1 ถู (แดงโม 1 ถู : ชุมชน) 9.ค่าอาหารกลางวันน้ำดื่ม (5,000 บาท) (LDI)	1.ค่าแรงงาน (พม่า) 17 คน x 300 บาท (5,100 บาท) (LDI) 2.แรง จากบริษัท กลีน ไชเคิล จำกัด 3 คน



วันที่	เส้นทางระหว่างชุมชน	จำนวนเงิน	อุปกรณ์/พาหนะ	อาหารและเครื่องดื่ม	แรงงาน
15-มี.ค.-62	สองแคว1-สองแคว2	4,480	1.มิดหัวด 2 ค้ำม มิดเล็ก 2 ค้ำม (กองทหาร 413) 2.เลื่อยยนต์ 1 ตัว (หน่วยดับเพลิง) 3.เครื่องตัดหญ้า 4 เครื่อง (กองอาสารักษาดินแดง) 4.ตระกร้าพลาสติก 1 ใบ 5.ชูชีพ 12 ตัว 6.รถยนต์ขนขยะ 4 คัน (เทศบาลแม่สอด รดกระบะใหญ่ 2 คัน และรดกระบะเล็ก 1 คัน, บริษัทคลื่นไซเคิล : รดกระบะ 1 คัน) 7.เรือพลาสติก 3 ลำ (หน่วยดับเพลิง 1 ลำ, กองอาสาสมัคร 2 ลำ) 8.มิด ค้ำม 9.คราด ค้ำม	1.เครื่องดื่มชูกำลัง (เอ็มร้อย 2 แพค : ชุมชน) 2.ค่าอาหารกลางวันน้ำดื่ม (5,000 บาท) (LDI)	1.ค่าแรงงาน (พม่า) 15 คน x 300 บาท (4,500 บาท) (LDI) 2.แรง จากบริษัท คลื่น ไซเคิล จำกัด 3 คน
	รวมเป็น	39,480	ไม่สามารถเป็นเงินได้	25,000 และที่ไม่สามารถเป็นเงิน	26,400 และแรงงานที่มาช่วย

รวมทั้งหมด 90,880 บาท และที่ไม่สามารถรวมเป็นตัวเงิน รวมถึงแรงงานที่มาช่วย

3) การสรุปบทเรียนรู้

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และตัวแทนหน่วยงาน ล้อมวงพูดคุยถึงการทำงานตลอดทั้ง 5 วัน ทั้งสิ่งดี ๆ สิ่ง que เห็นว่ายังต้องปรับ ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวัง

● สิ่งที่ได้ดี

- ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
- การประชุมเตรียมงานที่เป็นระบบ มีการแบ่งงาน การจัดการด้านอาหาร การจัดเตรียมอุปกรณ์
- หน่วยงานให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี
- การจัดเก็บขยะ วัชพืชได้เป็นจำนวนมาก ลำห้วยมีความสะอาด

● สิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี

- การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนควรมีเพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่มองว่าเป็นบทบาทของเทศบาลในการดำเนินการ รวมทั้งเห็นว่างานป้องกันผู้คนยังไม่ตื่นตัวนัก ตลอดจนความเป็นชุมชนเมืองที่อาชีพไม่เอื้อต่อการมีส่วนร่วมในช่วงเวลาของกิจกรรม
- การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานประสานทีละหน่วย/กอง ใช้เวลาในการประสาน
- การจัดการชุดดินออกจากลำห้วยยังไม่สามารถทำได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเร่งด่วนเพื่อลำห้วยมีพื้นที่รับน้ำและระบายน้ำได้ดียิ่งขึ้น
- การตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ การกำจัดวัชพืชบางจุด และเสาปูน เป็นเรื่องเกินความสามารถของชุมชน ในด้านเครื่องมือ และวิธีการจัดการ
- ระยะเวลาในการดำเนินการทำความสะอาดลำห้วยน้อยเกินไป

● ข้อเสนอแนะ

- การประสานหน่วยงานเข้าร่วมเพิ่มเติม เช่น ตำรวจ ศาลเจ้า หน่วยพยาบาล เป็นต้น
- การกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ 2-3 วันต่อชุมชน และกำหนดอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
- การบรรจุกิจกรรมในแผนงานของหน่วยงานเพื่อให้เป็นกิจกรรมต่อเนื่อง โดยผู้นำชุมชนนำเสนอข้อมูลด้วยตนเอง
- การประสานหน่วยงานเพื่อขอการสนับสนุนบุคลากร อุปกรณ์ และรถ ต้องประสานล่วงหน้า และระบุอุปกรณ์ที่สอดคล้องกับปัญหา เช่น รถแมคโครลอยน้ำ โดยประสานตรงไปยังรองนายกเทศมนตรี ผู้รับผิดชอบหลัก โดยจัดทำเป็นจดหมาย

- การประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างรวดเร็วขึ้น (ท่าสายลวด, แม่ดาว, แม่ปะ และสายน้ำ 4 แห่งที่มีผลต่อห้วยแม่สอด)
- เสนอให้เทศบาลนครแม่สอด ขนย้ายเสาปูนในลำห้วยแม่สอด เนื่องจากกีดขวางทางน้ำ และทำให้ขยะติดค้าง
- ควรมีผู้เฝ้าระวังตัดสินใจ สั่งการของแต่ละหน่วยอยู่หน้างานในบางช่วง เพื่อประสานงานให้ทันเหตุการณ์

● ข้อพึงระวัง

- การจัดจ้างแรงงาน ในส่วนที่ชุมชนไม่พร้อมทำ และบางชุมชนไม่มีแรงงาน ขณะที่แรงงานเหล่านี้ทำงานอย่างเต็มกำลัง ด้านหนึ่งเห็นว่าการจ้างแรงงานอาจมีผลกับงานอาสาที่มาด้วยใจ เป็นการร่วมแรงของชุมชน จึงอาจมีผลต่อความรู้สึก การมีส่วนร่วมของผู้คน
- จุดเสี่ยงต่ออุบัติเหตุ การทำความสะอาดลำห้วยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

● งานที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องอย่างเร่งด่วน และหาทางออก

1. ต้นไม้ที่ตัดแล้ว ขยะชิ้นใหญ่ แทะปูน ที่อยู่ในลำห้วยแม่สอดในพื้นที่ที่รถขยะเข้าไม่ถึง



2. ตะกอนมูลดินที่สะสมในลำห้วยที่เป็นสาเหตุให้น้ำไหลล้นจากพื้นที่รับน้ำแควลงและเป็นทิ้งอกของต้น ไม้ริมห้วย พิกัด N 16.7181393 E 98.5693115

บริเวณสำคัญที่สำคัญ เช่น ชุมชนจ็อกจอ-ประตูน้ำตัวที่ 1 (ศาลเจ้า) (บริเวณหน้าและหลังประตูน้ำ)



3. เปิดทางน้ำไหล เชิงสะพานห้วยแม่กุ-ชุมชนประจักษ์ไปออกจากกระบายนํ้าลงน้ำห้วยแม่กุ หน้าศุภรัตน์ มินิมาร์ท ปัญหาเพราะระบบท่อน้ำไม่เชื่อมต่อกันทำให้น้ำระบายได้ การแก้ปัญหาเบื้องต้นติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ได้รับการสนับสนุนจากชลประทาน เมื่อมีฝนตกหนักจะมีน้ำขังต้องใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำจากชุมชนเข้าสู่ห้วยแม่กุ พิกัด N 16.7075139 E 98.5498467



4. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน

- ชอชราษฎร์บูรณะ ชุมชนสักทอง-ชุมชนศาลเคี้ยว (ชอชบ้านลุงอาจ) ท่วมประมาณ 30-50 ซม. โดยประมาณ 4 ชอช ผู้ได้รับผลกระทบ 20 ครัวเรือน (40-50 คน) น้ำท่วมเป็นประจำทุกปี น้ำท่วมขังประมาณ 3-4 วัน สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่ต่ำ ระบบระบายน้ำไม่ทัน ท่อมีขนาดเล็กมีน้ำจากตำบลแม่ปะ (หมู่ 9,10) ซึ่งเป็นน้ำฝน และน้ำทิ้งจากหมู่บ้านมารวย สาเหตุหนึ่งเพราะไม่มีพื้นที่รับน้ำ (ปัจจุบันมีการถมที่กันหมด) พิกัด N 16.726006 E 98.563534 ข้อเสนอ ให้ใช้เครื่องสูบน้ำขนาดเล็กระบายน้ำออกจากชอชสู่ลำรางสาธารณะผ่านชุมชนศาลเคี้ยว-สองแคว2-ห้วยแม่สอด



- ชุมชนวัดหลวง เสริมผนังกันน้ำหลังศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก (บริเวณเรือนจำแม่สอด) โดยใช้ดิ่งเทียม ผลกระทบน้ำเข้าท่วมบริเวณชุมชนวัดหลวง และหน้าโรงเรียนราษฎร์วิทยา พิกัด N 16.7117119 E 98.5764750
- ชุมชนวัดหลวง เปิดทางน้ำหลังบ้านอดีต สส.ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พิกัด N 16.7065008 E 98.5763415

5. กระบวนการที่ต้องดำเนินการพูดคุยเพื่อการจัดการในระยะยาว เช่น เรื่องขยะ เรื่องน้ำเสีย เป็นต้น



////
